

Valutazione del Programma Interreg Italia-Albania- Montenegro IPA CBC 2014-2020


***Panoramica sulle principali
attività di valutazione 2021-2022***



a.r.t.i.
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



***Info Day Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-27
Bari, Fiera del Levante
20 ottobre 2022***

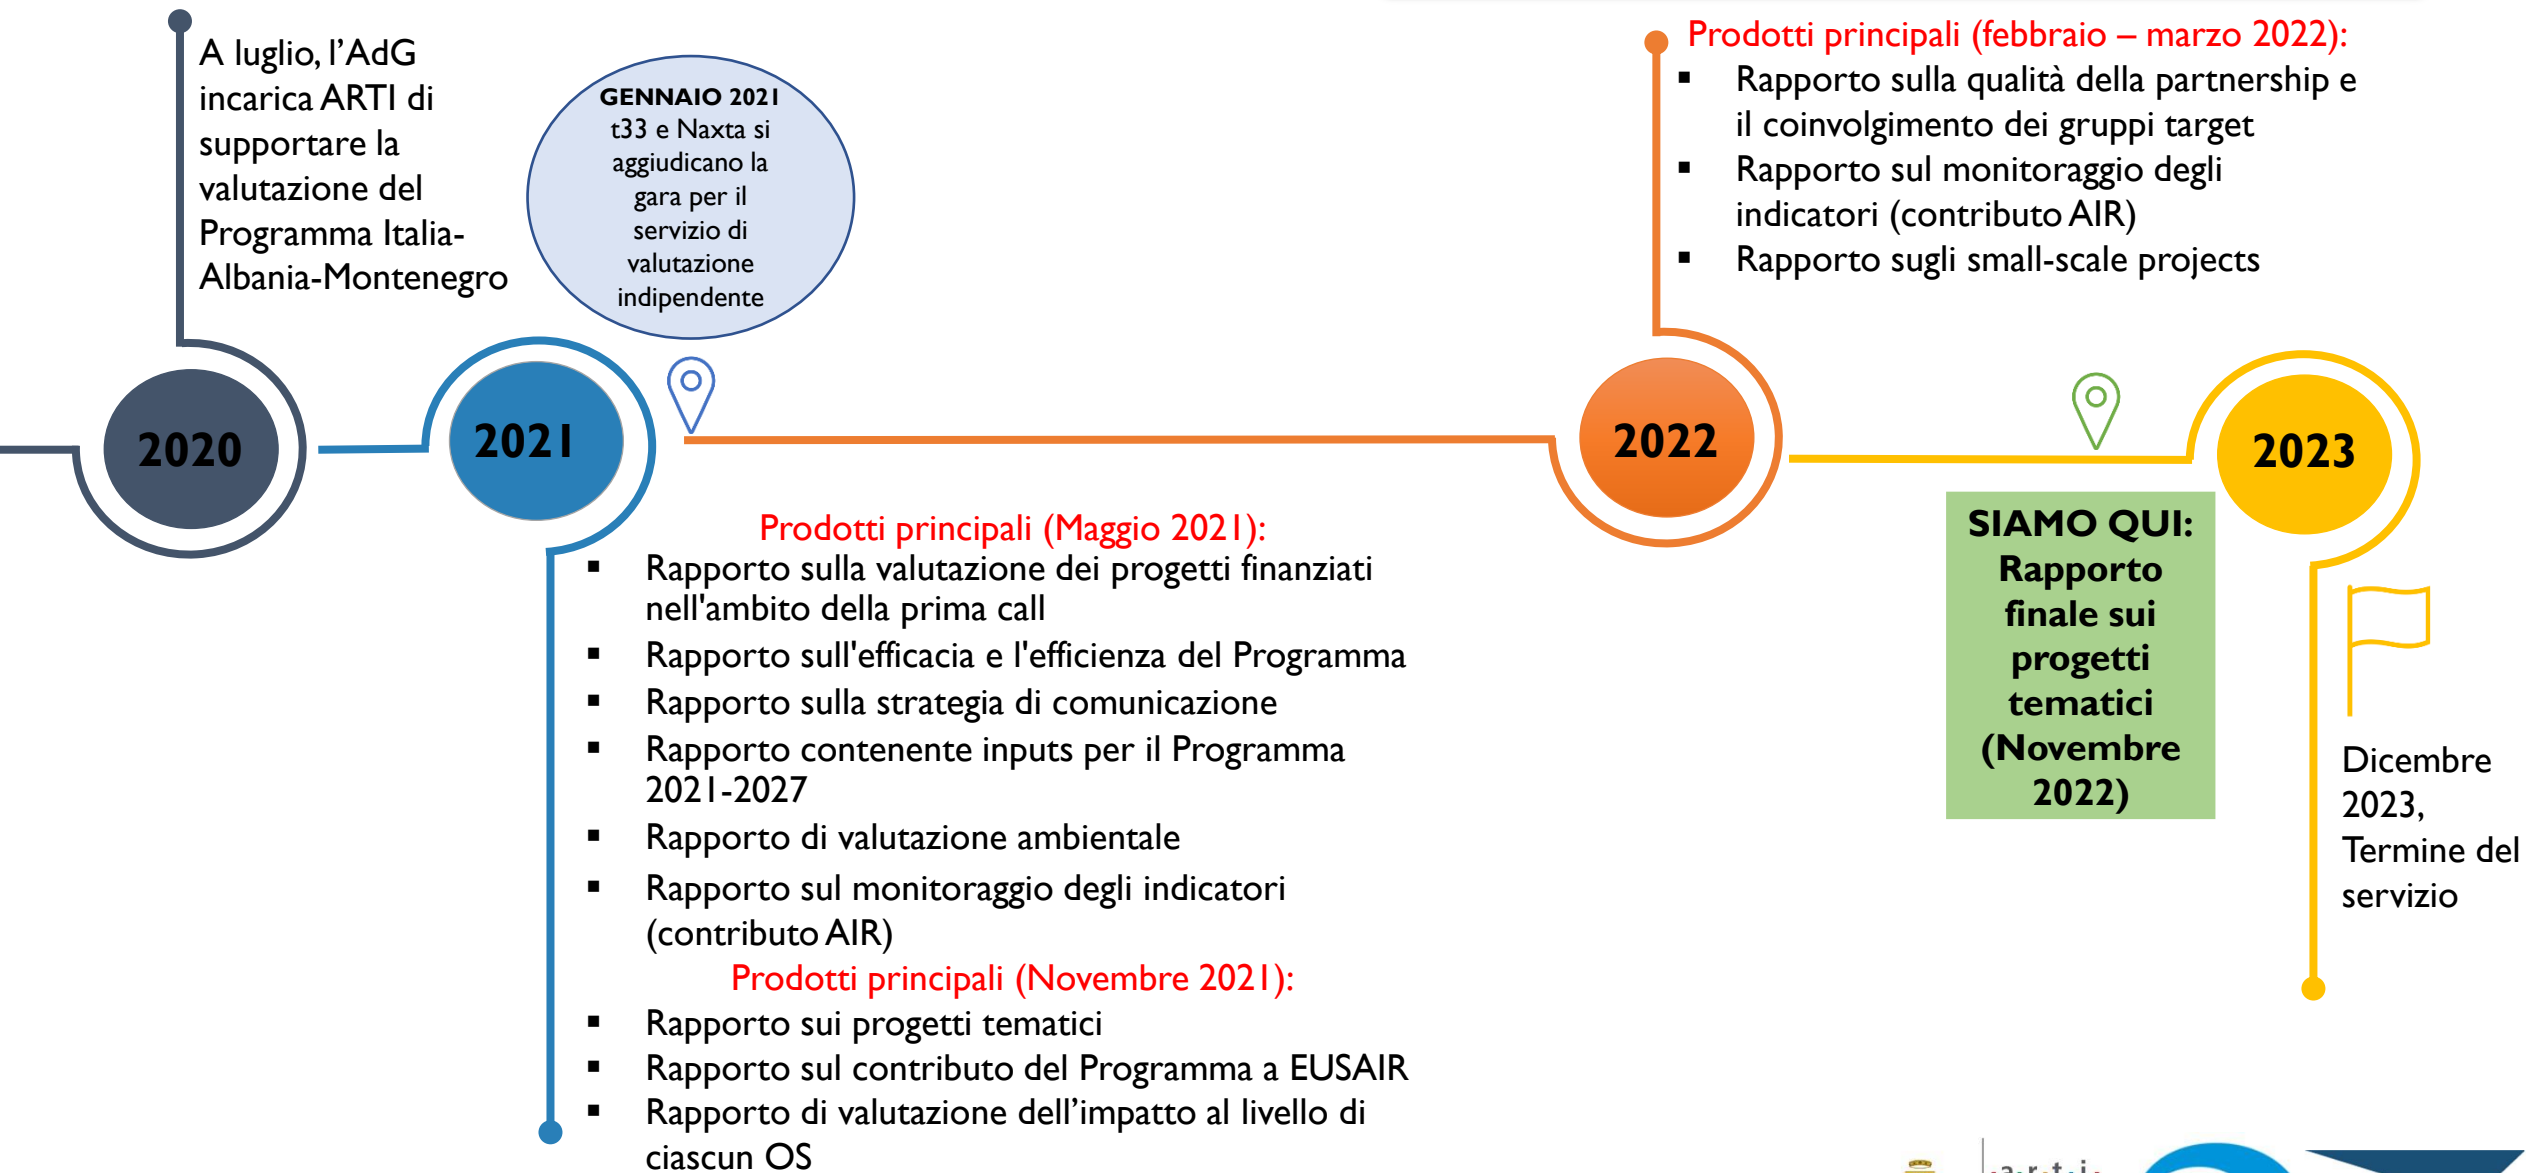



Interviste con il Segretariato congiunto e altre autorità del Programma



Web survey rivolta ai beneficiari di tutti i progetti finanziati



Analisi dei documenti del Programma e dei dati di monitoraggio



Casi studio (17 casi studio dei progetti, 33 interviste con i capofila e i partner dei progetti)



VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DEL PROGRAMMA

Capacità amministrativa

- **Le risorse umane sono adeguate per garantire una attuazione efficiente ed efficace del Programma**
- **La presenza di staff proveniente dai paesi partecipanti è limitata** (Il SC si compone di 6 funzionari italiani, 1 funzionario albanese e nessun montenegrino)

Key findings

Sistema di controllo e misure per ridurre gli oneri amministrativi

Il tempo necessario per effettuare i controlli e per rimborsare le spese è generalmente superiore a quanto previsto dalle regole definite nel manuale di Programma.

2 fasi sono particolarmente dispendiose in termini di tempo :

- **La fase di invio, da parte del partner di progetto, del progress report;**
- **La fase dei controlli**

Supporto ai beneficiari

- Il supporto fornito ai beneficiari è considerato di **ottima qualità**
- Nonostante i ritardi, **le informazioni fornite dal Programma** in relazione alle regole sull'ammissibilità delle spese **sono ritenute utili**
- La maggior parte del supporto richiesto dai beneficiari riguarda il **coordinamento con i partner di progetto**

Key findings

Sistema degli indicatori e performance framework

- Le analisi delle prestazioni finanziarie mostrano che il **Programma è lontano dall'obiettivo** fissato per il 2023
- La combinazione di **scarse prestazioni finanziarie e buone prestazioni fisiche** rivela che:
 - gli **obiettivi iniziali** posti dal Programma per misurare le prestazioni fisiche **erano sottostimati**
 - è possibile che ci siano state delle **incongruenze nei dati** dichiarati dai beneficiari
 - a volte i beneficiari incontrano delle difficoltà nel capire come monitorare gli indicatori



VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEI PROGETTI

Impatto dei progetti della prima call

- I **progetti** finanziati tramite la prima call **hanno prodotto risultati in linea con la logica di intervento del Programma**
- **La maggior parte dei progetti**, tra i diversi Obiettivi Specifici, **ha prodotto principalmente risultati "immateriali"** (reti transfrontaliere, attività di sensibilizzazione, implementazione di policy instruments)
- **Gli impatti** si riferiscono principalmente a: 1) **abilità e competenze** degli attori principali, 2) **consapevolezza** e coinvolgimento degli attori locali, 3) **miglioramento della governance** del territorio.

Impatto dei progetti tematici

I progetti tematici contribuiscono all'**aumento e al miglioramento dello scambio di conoscenze e competenze** tra i partner di progetti ma, rispetto a quanto ci si aspettava, **sembrano contribuire solo in misura limitata a migliorare la governance dei territori.**



QUALITÀ DELLA PARTNERSHIP E COINVOLGIMENTO DEI TARGET GROUPS

Qualità della partnership

La maggior parte dei progetti standard della prima call e della targeted call è stata **in grado di impostare/creare un partenariato consolidato**. In alcuni casi, la partnership è stata il risultato di **reti consolidate e precedenti collaborazioni**.

Per quanto riguarda la volontà di collaborare a nuovi progetti, in alcuni casi i partner di progetto **hanno già concordato di candidarsi insieme nel futuro**. Molti altri si sono impegnati a mantenere i risultati raggiunti anche dopo il completamento del progetto.

Coinvolgimento dei target groups

La maggioranza dei progetti analizzati ha **raggiunto**, e in molti casi, **superato** gli obiettivi dei gruppi target coinvolti.



VALUTAZIONE DEGLI SMALL-SCALE PROJECTS

SSP: Background

Il programma ha lanciato una targeted call indirizzata a **temi specifici non sufficientemente affrontati** nelle call precedenti. All'interno di questa call, sono stati collocati gli SSP.

Si tratta di un modo per testare **opzioni di finanziamento innovative**: i beneficiari devono solo dimostrare che i risultati siano stati prodotti e il rimborso viene elaborato in base a una somma forfettaria

Il bando prevedeva la possibilità di candidarsi per small-scale project con l'obiettivo di coinvolgere **piccole associazioni, ONG e comunità locali** che erano sottorappresentate nella prima call.

Small scale projects

La call è riuscita ad **attrarre nuovi partecipanti** al Programma poiché la maggior parte dei partner capofila ha riferito di non essere un partner di progetto Interreg nel precedente periodo di programmazione

Il bando è riuscito a coinvolgere piccole associazioni, ONG e comunità locali, che rappresentano il **50% dei partner e il 47% del budget totale stanziato**

La "certificazione della spesa" è considerata facile o molto immediata dai capofila dei progetti, il che significa che la «small scale» call **ha raggiunto con successo l'obiettivo di semplificare le procedure per i beneficiari** attraverso l'uso di OCS.

La maggior parte dei risultati dei progetti sono "immateriali", nel senso che di solito si riferiscono a elementi come la **creazione di reti transfrontaliere, lo svolgimento di attività di sensibilizzazione**. È anche interessante notare che alcuni progetti hanno implementato **strategie congiunte e testato nuovi strumenti e soluzioni**.



RACCOMANDAZIONI PER IL 2021-2027



Procedure del programma

- Potenziare il controllo di primo livello e l'organizzazione generale dei sistemi di controllo
- Fornire **formazione aggiuntiva sulla rendicontazione finanziaria e sulle procedure di certificazione** sia per i controllori di primo livello che per i beneficiari
- Elaborare una metodologia per **definire le Opzioni di Costo Semplificate (OCS) del programma** per la copertura dei costi del personale e dei costi di viaggio.
- Garantire una **metodologia solida** per definire degli obiettivi realistici per gli indicatori di output.



Impatto dei progetti della prima call

- Il Programma 21-27 deve considerare che **la capacità dei progetti di armonizzare, coordinare e integrare le politiche transfrontaliere è maggiore nei settori della prevenzione/gestione dei rischi di protezione ambientale e dei trasporti** rispetto a settori come le politiche del turismo, della cultura e dell'innovazione



Impatto dei progetti tematici: risultati....

I progetti tematici sembrano in grado di incidere in modo limitato sulla governance dell'area di cooperazione, soprattutto se confrontati con alcuni dei progetti standard della prima call che hanno saputo, con un budget inferiore, ottenere risultati ulteriori rispetto a quanto riportato nell'Application Form.

Nonostante le difficoltà e i rallentamenti dovuti alla pandemia di Covid-19, ciò che sembra mancare in questi progetti è una forte volontà dei partner di portare a termine le attività del progetto.

Inoltre, l'analisi ha mostrato che alcuni partner di progetto non hanno familiarità con le regole Interreg e non sono a conoscenza delle procedure burocratiche e amministrative relative all'attuazione del progetto.



...e suggerimenti! (in particolare per i progetti tematici)

Fase di programmazione

Considerando il budget totale del Programma, assegnare ai progetti tematici una porzione di budget inferiore

Fase di implementazione

Incoraggiare un maggiore impegno delle autorità nazionali nello stimolare e sostenere i partner di progetto.

Fase di selezione

- Verificare la capacità e la volontà dei partner di progetto selezionati (soprattutto nel caso dei capofila) a svolgere le attività progettuali
- Supportare i partner di progetto selezionati nella fase di sviluppo del progetto
- Considerare come capitalizzare i risultati dei precedenti progetti tematici quando si selezionano i temi strategici



Small scale projects

- Replicare l'attuazione di un bando specifico per small scale projects, potenziando e aumentando le risorse finanziarie disponibili
- Ampliare le opzioni di costo semplificate disponibili per i richiedenti, includendo nuove somme forfettarie
- Sviluppare una metodologia per includere somme forfettarie e SSUC tipiche dei programmi FSE (viaggi, corsi di formazione, ecc.)



PROSSIMI PASSI

2022

Rapporto finale sui progetti tematici (novembre 2022)
Rapporto sulle opzioni di costo semplificate (dicembre 2022)

2023

Relazione sul monitoraggio degli indicatori di risultato (giugno 2023)
Relazione finale di valutazione dell'impatto (settembre 2023)



a.r.t.i.
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Nicola Brignani

n.brignani@t33.it

www.t33.it

